PHOVA TECHNOLOGY


CHECKLIST DU PONT ROULANT

L'opérateur doit inspecter l'équipement avant de commencer les travaux, remplir la checklist d'inspection suivante et la déposer dans l'endroit dédié

Checklist N°:

Emplacement : MP1

N°	Description	Lundi		Mardi		Mercredi		Jeudi		Vendredi	
		Etat		Etat		Etat		Etat		Etat	
		Bon	Mauvais	Bon	Mauvais	Bon	Mauvais	Bon	Mauvais	Bon	Mauvais
1	Affichage de la charge MAX / عرض الحمولة القصوى	✓		✓		✓		✓		✓	
2	Boîte de commande (signe d'usure, propreté, etc.) / صندوق التحكم (علامات الاهتراء، النظافة، إلخ)	✓		✓		✓		✓		✓	
3	Linguet de sécurité du crochet / لسان الأمان للخطاف	✓		✓		✓		✓		✓	
4	Câble de levage (enroulement, signes d'usure, etc.) / كابل الرفع (لف، علامات الاهتراء، إلخ)		✓		✓		✓		✓		✓
5	Moufle d'accrochage et crochet (signes d'usure, de déformation, etc.) / حلقة الارتباط والخطاف (علامات الاهتراء، التشوه، إلخ)	✓		✓		✓		✓		✓	
6	Poulies – alignement des câbles, guide-câble, brins morts, signes d'usure dans la gorge de la poulie البكرات -توجيه الكابلات، وموجهات الكابلات، والخيوط المعطلة، وعلامات التآكل في أخدود البكرة	✓		✓		✓		✓		✓	
7	Accessoires de levage et d'accrochage (élingues, manilles, pinces de levage, etc.) / أدوات رفع وتعليق (أحزمة الرفع، الأشكال، مشابك الرفع، إلخ)	✓		✓		✓		✓		✓	
8	Avertisseur sonore / جهاز التنبيه الصوتي	✓		✓		✓		✓		✓	
9	Bouton d'arrêt d'urgence / زر التوقف الطارئ	✓		✓		✓		✓		✓	
10	Mouvements du pont roulant / حركة الرافعة الجسرية	✓		✓		✓		✓		✓	
11	Freins du pont roulant / فرامل الرافعة الجسرية	✓		✓		✓		✓		✓	
12	Fin de course de levage / نهاية الرفع	✓		✓		✓		✓		✓	
13	Fin de course au sol / نهاية الحركة على الأرض	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
14	Bruits inhabituels, vibrations, etc. / أصوات غير عادية، اهتزازات، إلخ		✓		✓		✓		✓		✓
15	Réducteur de vitesse, limiteur de charge, dispositif anticollision, etc. / مقلل السرعة، محدد الحمل،جهاز مانع التصادم، إلخ	✓		✓		✓		✓		✓	
16	Bon alignement du câble sur la poulie / توجيه جيد للكابل على البكرة	✓		✓		✓		✓		✓	
	Nom et prénom du vérificateur	DEBLANI		DEBLANI		DEBLANI		DEBLANI		DEBLANI	
	Date	05/01/26		06/01/26		07/01/26		08/01/26		09/01/26	
	Visa										

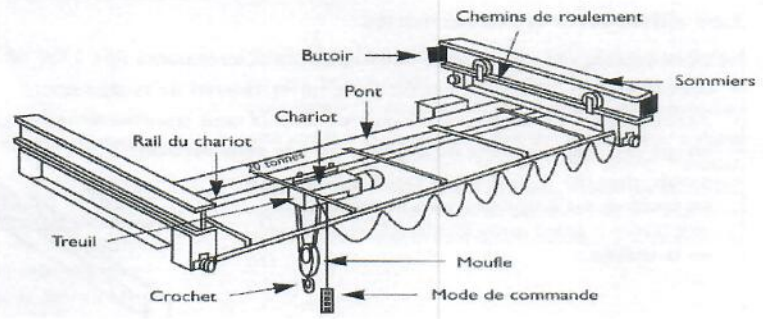

Remarques :

.....

.....
